


Liste de vérifications destinée au monteur,

cette check-list des points à contrôler constitue un outil pratique d'aide au montage. Elle permet une vérification des différentes étapes à effectuer lors du montage et contribue largement à assurer une excellente longévité à nos produits. Elle vient en complément de la notice de pose ci-jointe et doit être conservée une fois remplie.

Au montage du store

1. Vérifier l'entraxe à l'avant et à l'arrière du store (*différence maxi. 2 mm*)
Vérifier également les diagonales $X + Y$ (*différence maxi. 5 mm*)

fait:

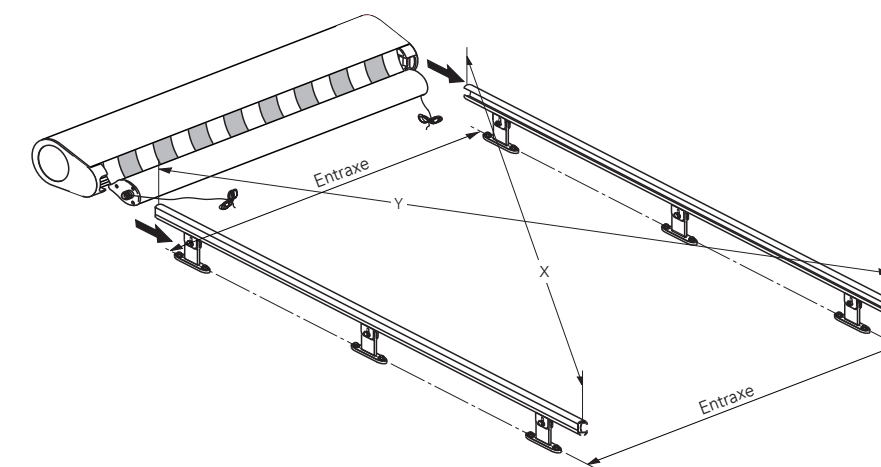☐


dimensions mesurées:

entraxe haut: _____ mm


entraxe bas: _____ mm

mesure X: _____ mm

mesure Y: _____ mm

Pendant le montage:


2. Vérifier le sens de passage du câble d'entraînement dans les coulisses (*sens de passage: du haut vers le bas*)

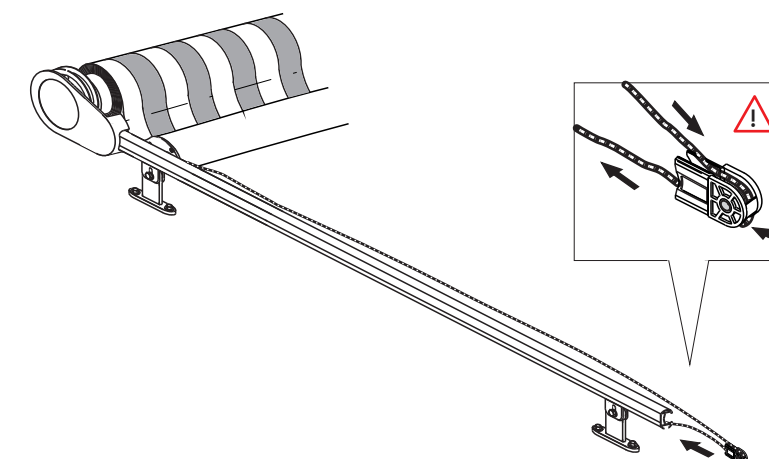☐


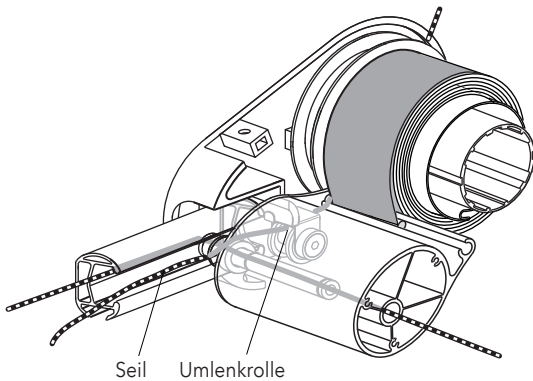
070056107




3. Seillänge und Knoten überprüfen (beidseitig 30 – 35cm von Kante Bodenprofil, Seilende darf max. 1-2 cm nach dem Knoten überstehen, aber auch nicht weniger)
- ☐

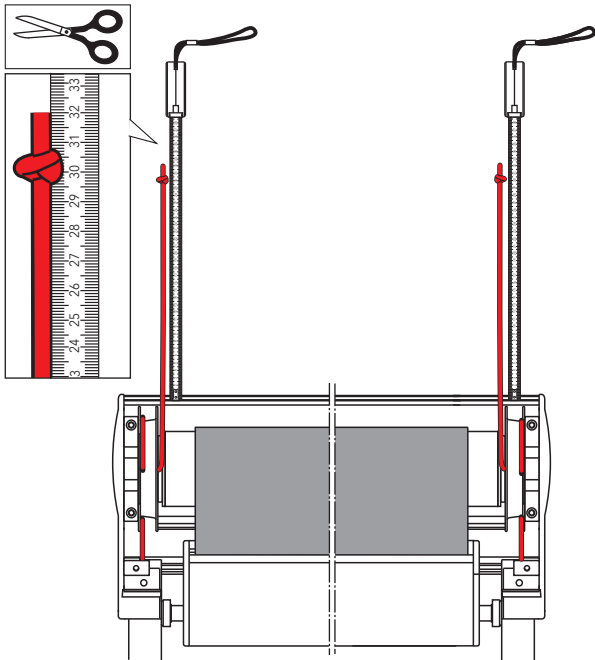

4. Seil muss auf der Umlenkrolle laufen
- ☐



5. Anlage ausfahren. Beim Aufwickeln muss die erste Lage des Seils nebeneinander liegen (ggf. von Hand nebeneinander legen)
- ☐

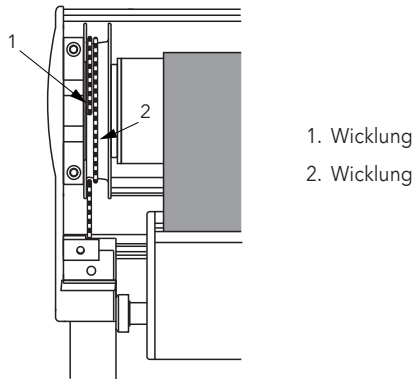

6. Obere und untere Endlage des Motors programmieren und festsetzen (siehe Beiblatt Einstellanleitung für Einsteckantriebe)
- ☐

7. Auf Kabelführung achten (darf nicht an der Seilscheibe streifen)
- ☐

8. Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen
- ☐

Nach der Montage:

9. Probelauf der Anlage durchführen, Endlagen und Tuchverlauf überprüfen (Motor muss bei Erreichen der Endlagen abschalten)
- ☐

10. Funktionsprüfung WISO (Zubehör)

Wind- und Sonnenwächter ☐ ja ☐ nein

Windfühler wurde auf folgenden Wert eingestellt:

Kommission:

Auftragsnummer:

Montageort / Adresse:

Firmenname / Ort:

Datum:

Unterschrift:
