

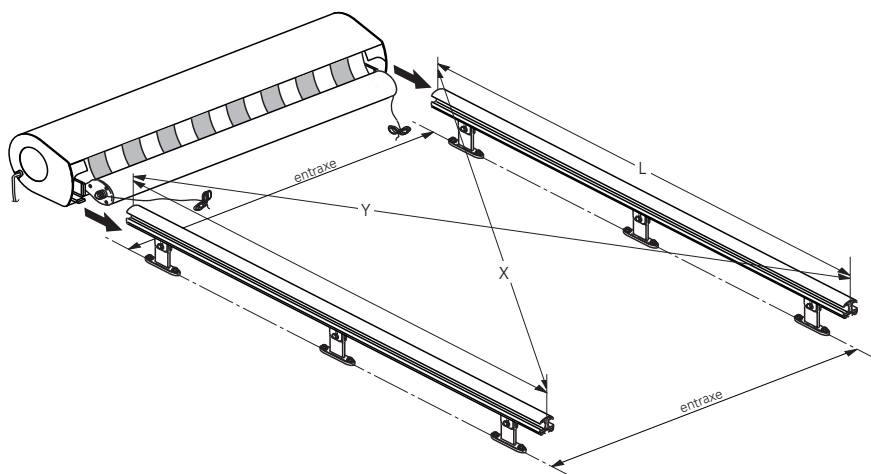
Liste de vérifications destinée au monteur,

cette check-list des points à contrôler constitue un outil pratique d'aide au montage. Elle permet une vérification des différentes étapes à effectuer lors du montage et contribue largement à assurer une excellente longévité à nos produits. Elle vient en complément de la notice de pose ci-jointe et doit être conservée une fois remplie.

Au montage du store:

1. Vérifier l'entraxe à l'avant et à l'arrière du store (*différence maxi. 2 mm*)
Vérifier également les diagonales X + Y (*différence maxi. 5 mm*)

fait:

☐


dimensions mesurées:

entraxe haut: _____ mm

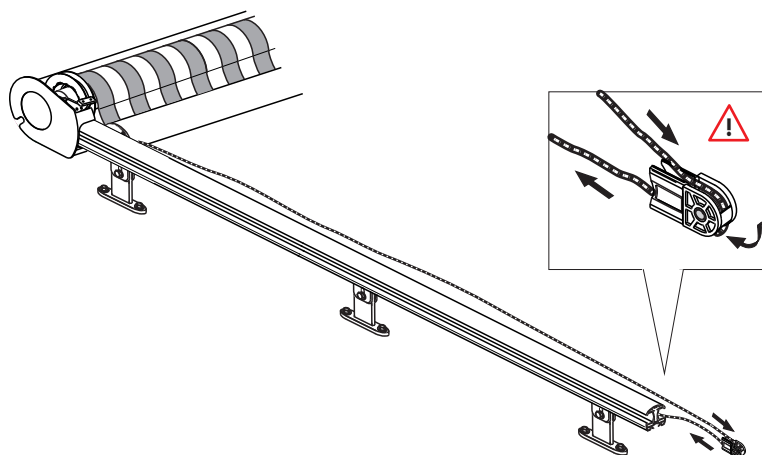
entraxe bas: _____ mm

mesure X: _____ mm

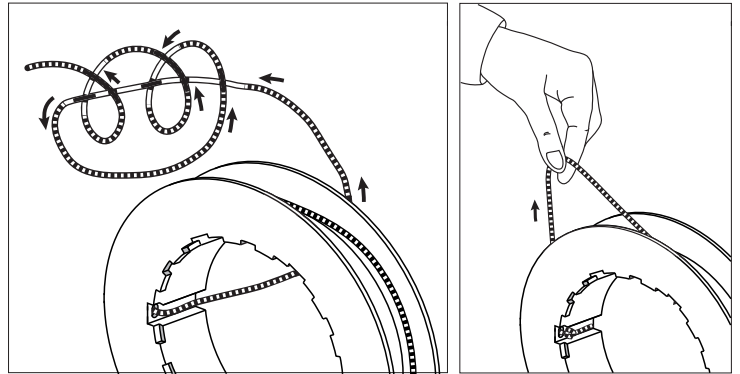
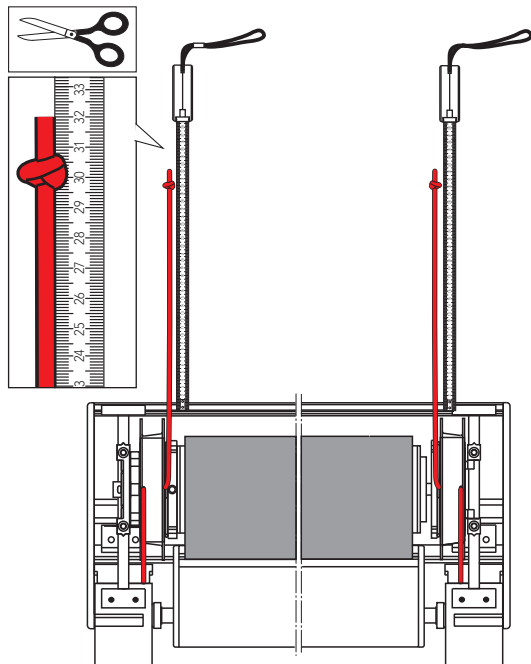
mesure Y: _____ mm

Pendant le montage:

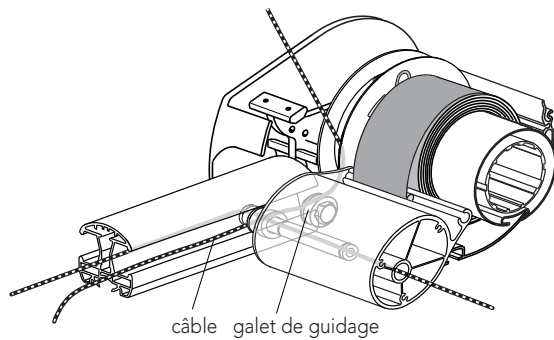
2. Vérifier le sens de passage du câble d'entraînement dans les coulisses (*sens de passage: du haut vers le bas*)

☐


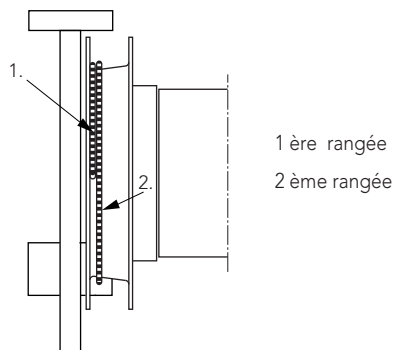
3. Vérifier la longueur du câble d'entraînement et la position des nœuds (de chaque côté env. 30 - 35 cm du mécanisme jusqu'au nœud et maxi. 1-2 cm du nœud à l'extrémité du câble, ni plus, ni moins)



4. Le câble d'entraînement doit passer dans le galet de guidage



5. Dérouler le store. Lors de l'enroulement, les premières rangées de câble doivent être côte à côte (le cas échéant, les positionner manuellement)



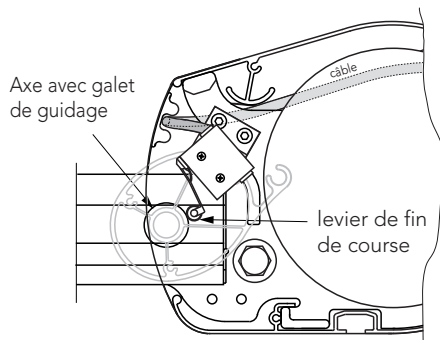
6. Programmer et bloquer la position des fins de course haut et bas

(uniquement Somfy et moteur à commande radio intégrée, voir en annexe notice de réglage des moteurs)

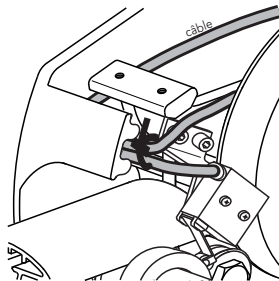
☐

7. Veiller à positionner correctement le fin de course, l'axe avec galet de guidage doit entrer en contact avec le levier du fin de course en position fermée

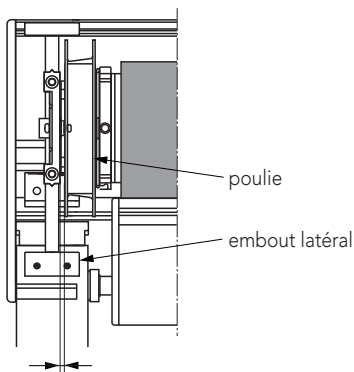
(excepté en cas de moteur à commande radio intégrée, si nécessaire maintenir le levier avec une pince et ensuite le replier vers l'avant)

☐

8. Veiller au positionnement du câble capteur fin de course (le câble ne doit pas entrer en contact avec la poulie, le fixer avec des attaches)

☐

9. La poulie ne doit pas entrer en contact avec l'embout latéral côté moteur

☐

10. Vérifier que toutes les vis sont solidement serrées

☐

Après le montage:

11. Effectuer les essais de fonctionnement du store, vérifier le réglage des fins de course et l'enroulement de la toile (*le moteur doit s'arrêter lorsque les positions finales sont atteintes*)

☐


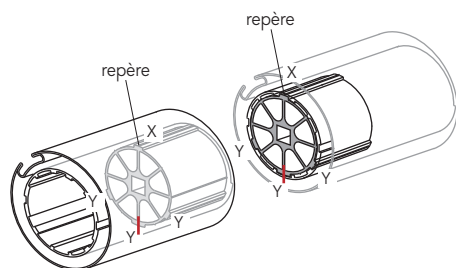
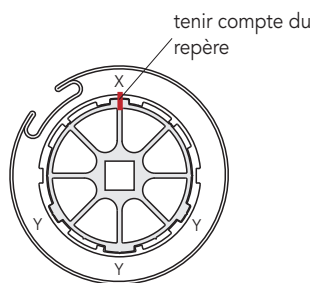
12. Test fonctionnel du capteur vent/soleil (accessoires)

☐

capteur vent/soleil ☐ oui ☐ non

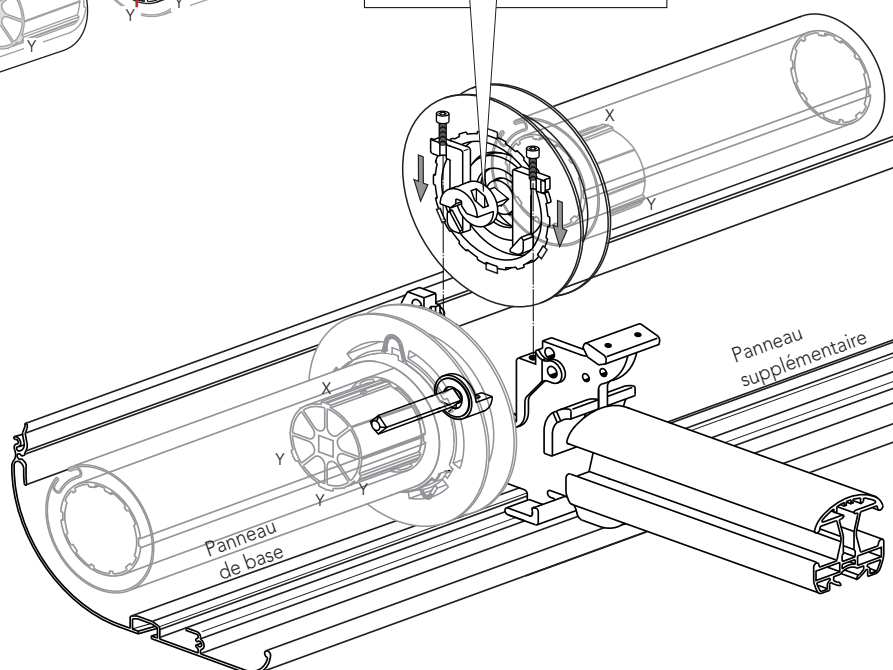
Le capteur vent a été réglé sur la base des valeurs suivantes: _____

13. Accouplement du panneau de base et du panneau supplémentaire

☐


⚠ Attention

Les guides X et Y des embouts d'axe d'enroulement (du panneau de base et du panneau supplémentaire) doivent être alignés. Pour faciliter cet alignement, le guide X est marqué d'un repère de couleur rouge. Prière d'en tenir compte ! De même, les panneaux à accoupler doivent comporter le même nombre d'enroulements de toile et les rainures des axes d'enroulement doivent être en parfait alignement.



Affaire: _____

N° de commande: _____

Lieu de montage/adresse: _____

Société / ville: _____

Date: _____

Signature: _____

070055585F
